



Arbeid med utstyrsanskaffelser

Nytt sykehus i Drammen

Leverandørkonferanse 11. april 2018

Elisabeth Gudmundsen
Prosjektsjef utstyr



Utstyr – hva er det?

Brukerutstyr

Byggutstyr

Rørpost

Medisinsk utstyr

Funksjonsutstyr

EKG

Møbler



Instrumenter

Funksjonsutstyr

- Medisinsk teknisk utstyr (MTU)
- Grunnutrustning
 - Utstyr for logistikk, avfallshåndtering m.m.
- Løst inventar
- IKT-utstyr



Noen tall...

- 4090 rom
- 2712 artikler/utstyrstyper
- Ca 50 000 forekomster – vil øke (Nye Ahus: ca 135 000)
- Ca 50 anskaffelsespakker (?)
- Avtaler
 - Nytt østfoldsykehus ca 170 avtaler
 - Nye Ahus ca 300 avtaler



Faser i et utstyrsprosjekt

- Konseptfase med utarbeidelse av hovedprogram
- **Forprosjekt**
- Detaljprosjekt
- Anskaffelse
- Leveranse / mottak / testing
- Opplæring
- Overlevering til drift

Hovedprogram utstyr

Nytt Vestre Viken sykehus



Versjon 2.2


Mai 2016

Forutsetninger:

- Mest mulig standardløsninger
- Gode, funksjonelle løsninger
- Driftseffektivt med robuste og fremtidsrettede løsninger
- Kjent teknologi
- Ta høyde for teknologisk utvikling, spesielt mhp integrasjon utstyr-IKT

Forprosjekt


- Utstysprogram
- Kartlegging eksisterende utstyr
- Spesifikasjoner generisk → spesifikk
- Grensesnittsinformasjon
- **Modell for anskaffelse av utstyr - anskaffelsesplan**

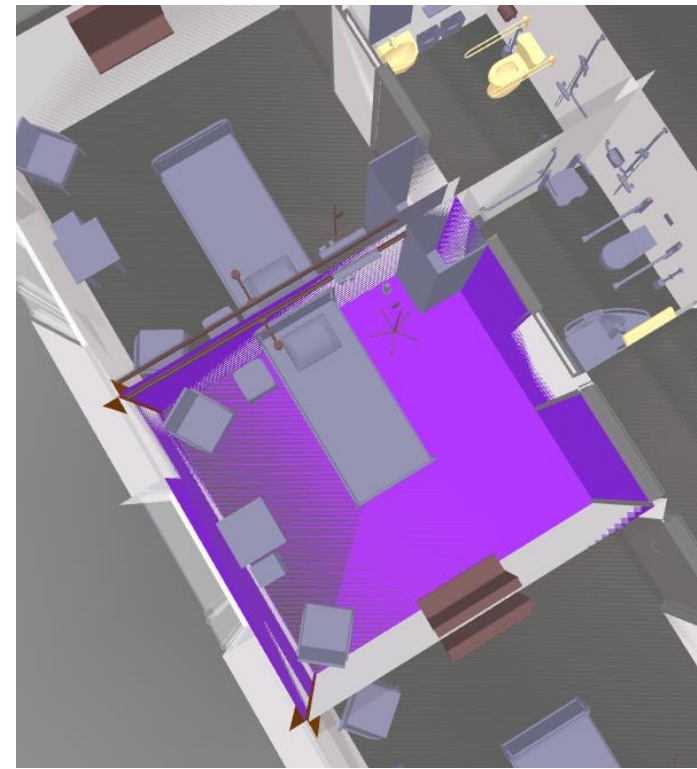

Anskaffelsespakker

Hva er hensiktsmessig inndeling når det gjelder

- Leverandørmarked?
- Fagområde?
- Medvirkning?
- Anskaffelsesprosedyre?
- Størrelse/antall?

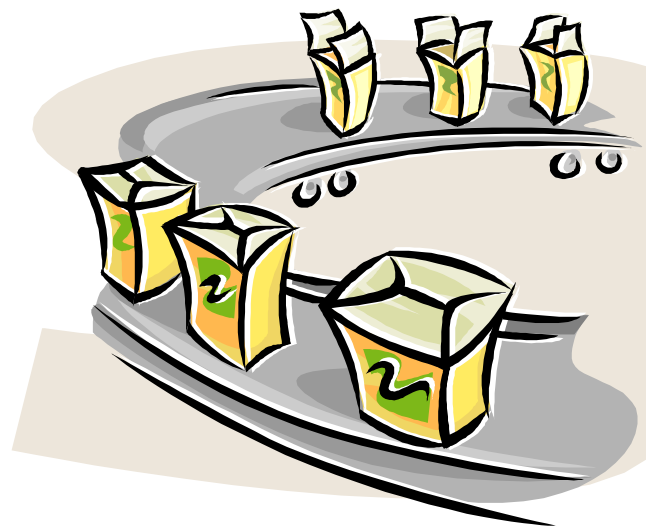

Ansvar for å oppfylle utstyrsprogrammet fordeles mellom Vestre Viken HF og Helse Sør-Øst v/prosjektorganisasjonen

- HSØ: 71%
- Vestre Viken HF: 29%
 - Inkluderer både nytt og overflyttbart utstyr
- **Felles anskaffelsesplan**



Før anskaffelsene



- Etablere malverk
- Samarbeid med
 - Regionalt kompetansesenter for samordning av investeringer i medisinsk-teknisk utstyr i HSØ (RKMTU)
 - Sykehusinnkjøp
- Koordinering av anskaffelser med OUS-prosjektene?

Dialog med leverandørene

- Generelle informasjonsmøter
- Dialogmøter
- I forkant av anskaffelser
 - Dialogmøter
 - Informasjon om tilgjengelig utstyr og teknologi
- Planlagte anskaffelser annonseres på Doffin
- Viktig at dialog med markedet og leverandører er styrt slik at vi kan ivareta likebehandling

Anskaffelsesprosedyrer

- Offentlige anskaffelser
- Anbudskonkurranse – åpen/begrenset
- Konkurranse med forhandlinger
- Konkurransepreget dialog
- Rammeavtaler

Anskaffelser

1. Bygg- og installasjonspåvirkende utstyr der vi har behov for utstyrsinformasjon for å prosjektere ferdig arealer eks
 - Utstyr til operasjonsstuer
 - Utstyr til sterilsentral
 - Bildemodaliteter – MR, CT
 - Stråleterapi
2. Anskaffelsesprosedyrer med lang gjennomføringstid eks
 - Analysehall
3. Installasjonspåvirkende utstyr
4. Løst utstyr



Fremdrift - tentativ

2020-21

oppstart anskaffelser bygg- og installasjonspåvirkende utstyr

2022

anskaffelser

2023-24

anskaffelser

utstyrsinstallasjoner

2024-25

utstyrsinstallasjoner / -leveranser

opplæring

ibruktagelse
